

---

**Clubhaus – Bautagebuch**

---

**13.11.06**

Die Lage des Gebäudes wird eingemessen.



---

**16.11.06**

Die Suche nach gewachsenem Boden..



---

## 01.12.06

Die Fundamente werden ausgehoben.  
Der erste Beton fließt.



---

**02.12.06**

Einige Bäume müssen gefällt werden.



---

**08.12.06**

Einschalen der Bodenplatte.



---

**10.12.06**

Infoveranstaltung zum Clubhausbau für alle Interessierten im Café Lichtenthal.



---

**11.12.06**

Firma Hoff beim Verlegen der Rohre.



---

**12.12.06**

Alle Rohre und das Erdungsband sind verlegt.



---

**13.12.06**

Einbringen der Filterschicht.



---

**14.12.06**

Herstellen der Bodenplatte.



---

**15.12.06**

Erste Lieferung der Ytong-Steine für das Außenmauerwerk.



---

**22.12.06**

Stein für Stein wächst unser Haus.



---

## 10.01.07

Zweite Lieferung der Ytong-Steine für das Außenmauerwerk.



---

## 12.01.07

Nach zweiwöchiger Pause geht es auch im neuen Jahr zügig voran.



---

## 17.01.07

Fertigstellen der Vorarbeiten für die Erdgeschossdecke.



**19.01.07**

Lieferung der Erdgeschossdecke.





---

**24.01.07**

Erste Elektrokabel werden verlegt.



---

**06.02.07**

Es ist so weit:  
Fa. Hoff betoniert die Erdgeschossdecke.



---

**15.02.07**

Fleißig wird weiter an den Außenwänden gemauert.



---

**22.02.07**

Schon eindeutig zu sehen:  
Die Neigung des Daches.



---

**23.02.07**

Weitere Mauerarbeiten im Obergeschoss werden erledigt.



---

## 09.03.07

Der Ringanker, sowie das Fundament des Pfeilers auf der Terrasse wird betoniert.

Aufgrund des Regenwetters bleibt das Betonauto im Matsch stecken und kann nur mit Mühe befreit werden.



---

**16.03.07**

Mauerarbeiten an den Außenwänden sind beendet. Nun werden erste Arbeiten bezüglich des Daches erledigt.





---

**20.03.07**

Letzte Arbeiten, bevor das Dach aufgelegt wird, werden erledigt: Die Regenrinne und das Terrassengebälk werden angebracht.



---

**21.03.07**

Fa. Scholtes installiert das Dach.





---

**29.03.07**

Drei Feuerschutztüren werden gesetzt.



---

**31.03.07**

Der Boden wird isoliert und die ersten Zwischenwände im Haus werden gesetzt.





---

## 07.04.07

Es werden die Ständerwände im Innenbereich gestellt und andere Arbeiten erledigt.



---

**14.04.07**

Elektro- und Wasserleitungen werden zum Haus gelegt.  
Außerdem werden Erdarbeiten ums Haus durchgeführt.





---

## 19.04.07

Gastank, Zisterne und Fenster werden geliefert. Außerdem wird mit dem Setzen der Fenster begonnen.



---

**21.04.07**

Die Drainage wird gelegt und andere Erdarbeiten erledigt.





---

**26.04.07**

Fa. Görg baut Fenster und Rollläden ein.



---

**28.04.07**

Weitere Innenwände werden gestellt.



---

**09.05.07**

Fa. Keil führt die Sanitärinstallation durch.



---

**12.05.07**

Elektrokabel werden verlegt, sowie weitere Arbeiten an den Innenwänden vorgenommen.



---

**19.05.07**

Weitere Planungen, sowie weitere Innen- und Außenarbeiten werden erledigt.





---

**26.05.07**

Letzte Arbeiten an den Innenwänden werden vollendet und weitere Elektrokabel verlegt.



---

**02.06.07**

Die letzten Kabel werden verlegt, sodass Fa. Schlag (Estrich) ihre Arbeit erledigen kann.





---

## 30.06.07

Nachdem der Estrich getrocknet ist, werden viele verschiedene Arbeiten im und um dem Haus angegangen.



---

**06.07.07**

Viele weitere kleine und große Arbeiten werden durchgeführt.



---

**16.07.07**


Viele verschiedene Arbeiten werden erledigt.



---

**17.07.07**

Neben Arbeiten im Haus, wird damit begonnen den Zaun um Platz 3 zu kürzen.

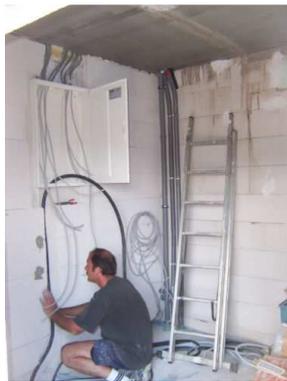

---

**20.07.07**

Unter anderem werden Blenden an den Wänden angebracht.



---

**21.07.07**

Die Außenanlage wird verschönert und weitere Arbeiten im Haus fortgeführt.





---

**25.07.07**

Der Innenausbau schreitet voran.



---

**30.07.07**

Neben einer Putzaktion wird auch die Elektroinstallation durchgeführt.



---

**03.08.07**

Die Heizung ist eingebaut und an der Küche, sowie den Toiletten werden weitere Arbeiten verrichtet.



---

**06.10.07**

Schienen werden gesetzt und die Sockelleiste verputzt.



---

**17.10.07**

Es wird begonnen, den Außenputz aufzutragen.



---

**24.11.07**

Fertigstellen des Außenputzes noch vor Wintereinbruch.



---

**14.03.08**

Weiter geht's mit dem Innenausbau.



---

**22.03.08**

Mit Farbe werden die Innenräume gestaltet.





---

**19.04.08**

Weitere Erdarbeiten rund ums Haus werden fortgeführt und der Thekenbau wird begonnen.



---

**27.04.08**

Fertigstellung unserer Theke.



---

**07.08.10**

Pflasterarbeiten rund um das Clubhaus schreiten voran.

